

Waterschap Limburg  
t.a.v. dhr. A. Gerrits  
Postbus 2207  
6040 CC Roermond

Datum 3 april 2020

Van G. de Jong  
Telefoon +31 6 53 16 56 85

Onderwerp Dijkversterking Buggenum  
Uw voorgenomen inkoopstrategie

Ons kenmerk 20200403/TFDT/WL/Buggenum

Bijlagen -

Uw kenmerk Buggenum

Geachte heer Gerrits, Beste Albert,

De Taskforce Deltatechnologie (hierna TFDT) heeft drie maal een advies uitgebracht over de inzichten van uw Waterschap Limburg (hierna WL) over de marktbenadering HWBP opgaven:

1. Januari 2016: Advies marktbenadering HWBP Peel- en Maasvallei
2. Juni 2018: Advies markstrategie werkpakket 1
3. Augustus 2018: Advies markstrategie werkpakket 2

In november 2019 heeft u ons teruggekoppeld dat de verdeling van de opgave in 4 werkpakketten is losgelaten, om de voortgang van de versterkingsopgave niet te stagneren.

De adviezen van TFDT hebben jullie waar mogelijk wel meegenomen in de aanpak van de projecten.

Op 11 maart hebben we een toelichting ontvangen op de voorgenomen aanpak van de dijkversterking Buggenum.

Het project kent een aantal kenmerken:

- Er is meer dijk lengte nodig bij de aansluiting hoge grond, waarbij de omwonenden zich bewust moeten worden van nut en noodzaak.
- Een deel van de grondverwerving moet nog plaatsvinden in de Planfase.
- Er zitten een paar "specials" in de conditionering, onderzoeken die nog opgestart dienen te worden en die bij voorkeur met een uitvoerende partij worden opgestart.
- Een verlegging van de harde kering en jachthaven
- Het realiseren van een kering in directe invloedsgedebied van de spoorlijn.




Figuur 3: Alternatieven dijktraject Buggenum (voorkeursalternatief is groen opgenomen)

De voorgenoemen marktbenadering van WL:

- Contracteren consortium door middel van een tweefasenaanpak:
  1. Fase 1: DO uitwerken: WL is verantwoordelijk, de uitvoerende aannemer toetst de maakbaarheid. Er wordt een DO+ uitgewerkt met risico mitigerende maatregelen
  2. Fase 2: E&C contract
- WL wil Witteveen+Bos en Arcadis zoveel mogelijk in het verdere traject betrekken voor de ingenieursdiensten.
- Voor advisering van de tweefasenaanpak is Paul van Dijk door WL ingeschakeld.

In 2019 heeft TFDT samen met Paul van Dijk een tweefasenaanpak uitgewerkt, het zogenaamde "repetierend contractmodel". Een verdere uitwerking van de toepassing is binnenkort te vinden op <http://www.taskforcedeltatechnologie.nl>

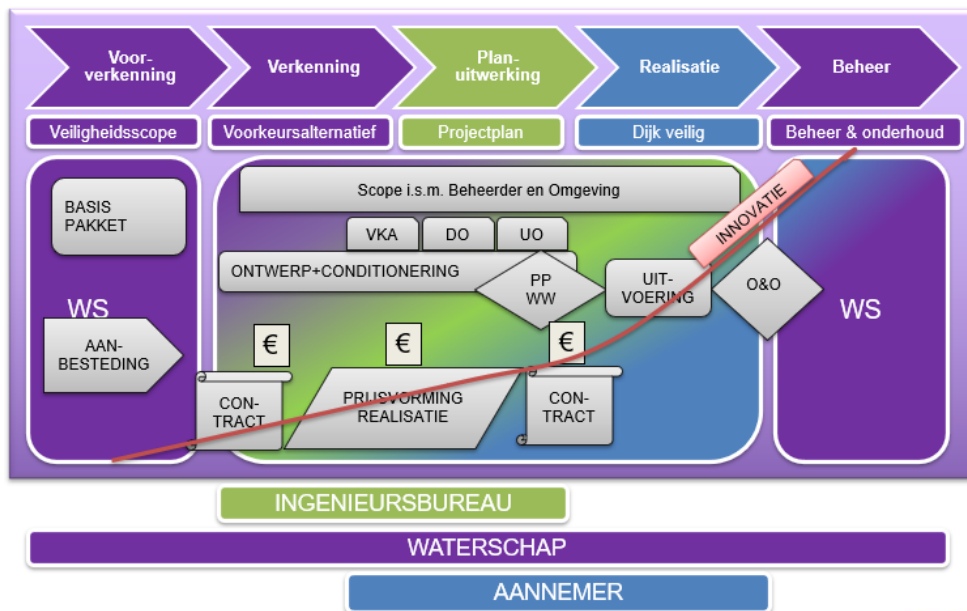

Onderwerp      Inkoopstrategie dijkversterking Buggenum  
Datum            3 april 2020  
Pag. nr.         3

In de toelichting hebben we begrepen dat uw aanpak is gestoeld op de gedachte van een tweefasenaanpak.

Wij hopen dat deze aanpak voor jullie een opmaat is naar een repeterende aanpak, waarin de markt zich gaat herkennen als de aanpak van WL.

Graag geven we nog een aanbeveling mee voor de te houden assessments in de aanbestedingsfase: Doe dit niet te vroeg in de aanbesteding. Sleutelfunctionarissen kunnen zo ook in de dialoog “gemeten” worden en het wordt voor WL echt duidelijk met wie ze te maken hebben. Een vroeg assessment is teveel een momentopname.

Er zijn al een aantal lessons learned met teamassessments in het HWBP:

- HHNK: Markermeerdijken, Aanpak 7 kunstwerken
- WDOd: Kampereilanden, Stadsdijken Zwolle, nu in tender Zwolle-Olst
- WSRL: Gorinchem-Waardenburg en Wolferen-Sprok
- NZV: Lauwersmeer-Vierhuizergat (Best Value)
- HDSR: nu in tender Sterke Lekdijken

Wij hebben er vertrouwen in dat Waterschap Limburg met de aanpak een goede invulling geeft aan de Marktvisie en wensen u veel succes met de voorbereidingen van de aanbesteding.

Met vriendelijke groet,

Namens de Taskforce Deltatechnologie,



Gerben de Jong  
Gert-Jan Meulenpas  
Jauk Stroo  
Ronald van Dongen
